




Contrato No: 2015-30-195-0003  
Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS  
Contratista: MIGUEL JAVIER DIAZ MORAEN  
Evaluación No. 2 y FINIQUITO al 28-ago-15  
Periodo Estimado: 18-jun-15 al 22-jul-15  
Periodo de Contrato: 05-may-15 al 22-jul-15  
Importe de Contrato: \$ 300,715.62  
Anticipo (c/iva) \$ 91,413.79

**FINIQUITO DE OBRA**


CLAVI	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADICION.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADICION.	IMPORTE FINIQUITO
1	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS MENORES DE 400 M2.	m <sup>2</sup>	74.69		74.69	\$ 5.82		\$ 5.82	\$ 434.70		\$ 434.70
2	CIMENTACION EXCAVACION A MANO EN CEPAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ZONA A. MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	m <sup>3</sup>	30.90	0.73	30.17	\$ 92.39		\$ 92.39	\$ 2,854.85	\$ 67.44	\$ 2,787.41
3	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", F C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. ZAPATA DE CIMENTACION AJUSTADA DE 1.20 X 1.20 MTS PERALTE= 15 CMS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy=42000 KG/CM2 DEL NO.4 @ 20 CM PERALTE EN AMBOS SENTIDOS.	m <sup>2</sup>	14.72	11.52	26.24	\$ 97.20		\$ 97.20	\$ 1,430.78	\$ 1,115.74	\$ 2,546.52
4	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4". T.M.A MM INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM-100 KG/CM2, 60 KG/CM2 ACERO/MS	pza	8.00		8.00	\$ 806.90		\$ 806.90	\$ 6,455.20		\$ 6,455.20
5	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 40 X 40 X 80 CM., CONCRETO F C=200 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DE 3/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	pza	7.00		7.00	\$ 641.93		\$ 641.93	\$ 4,493.51		\$ 4,493.51
6	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 40 X 40 X 130 CM., CONCRETO F C=200 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DE 3/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	pza	1.00	1.00		\$ 726.79		\$ 726.79	\$ 726.79		\$ 726.79
7	CIMIENTO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA, DALA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 5 VARILLAS DE 3/8" R/A DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA Y HABILITADO DE ACERO.	m <sup>3</sup>	12.85	0.23	12.42	\$ 1,082.02		\$ 1,082.02	\$ 13,687.55	\$ 248.86	\$ 13,438.69
8	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES.	m <sup>3</sup>	33.80	5.80	28.00	\$ 318.18		\$ 318.18	\$ 10,754.48	\$ 1,845.44	\$ 8,909.04
9	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES. ALBANELERIA CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m <sup>3</sup>	13.09		13.09	\$ 60.27		\$ 60.27	\$ 788.93		\$ 788.93
10	CONCRETO F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m <sup>3</sup>	0.80		0.80	\$ 205.78		\$ 205.78	\$ 164.62		\$ 164.62
11	CONCRETO F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m <sup>3</sup>	13.80	13.62	27.42	\$ 234.28		\$ 234.28	\$ 3,233.06	\$ 3,190.89	\$ 6,423.95
12	MURO DE TABIQUE DE BARRIO ROJO RECOCIDO DE 11 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; ACABADO COMÚN.	m <sup>2</sup>	41.41		41.41	\$ 235.41		\$ 235.41	\$ 9,748.33		\$ 9,748.33
13	APLUMADO ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:6; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTAS.	m <sup>2</sup>	86.11	22.06	64.05	\$ 107.90		\$ 107.90	\$ 9,291.27	\$ 2,380.27	\$ 6,911.00
14	3 HILADA DE TABIQUE ROJO 6 A 14 CM CON MORTERO CEM:CAL:ARENA 1:1:6. ACABADO COMÚN, SOBRE ORILLA DE LOSA.	m <sup>2</sup>	34.24	0.18	34.06	\$ 15.59		\$ 15.59	\$ 533.80	\$ 2.81	\$ 530.99
15	BOQUILLA EN VENTANAS Y PUERTA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CONSIDERANDO UNA ARISTA PISO DE CONCRETO SIMPLE	m <sup>2</sup>	109.40	14.36	95.04	\$ 43.62		\$ 43.62	\$ 4,772.03	\$ 626.38	\$ 4,145.65
16	F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO POR MEDIO MANUAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARRO DEL MATERIAL TENDIDO Y NIVELADO: USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m <sup>2</sup>	45.92	0.45	45.47	\$ 176.01		\$ 176.01	\$ 8,082.38	\$ 79.20	\$ 8,003.18
17	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO.	m <sup>2</sup>	10.92	45.2654	56.1834	\$ 180.35		\$ 180.35	\$ 1,969.42	\$ 8,163.25	\$ 10,132.67
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 33 X 33 CM. DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	m <sup>2</sup>	45.92	0.45	45.47	\$ 282.76		\$ 282.76	\$ 12,984.34	\$ 127.24	\$ 12,857.10
19	CM. EN MODULO DE MESETA DE FREGADEROS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:2; JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	m <sup>2</sup>	3.57	0.53	4.10	\$ 295.98		\$ 295.98	\$ 1,056.65	\$ 156.87	\$ 1,213.52
20	CHALAN EN LOSA SECTION 10 CMS DE ALTURA Y 10 CMS DE BASE CONCRETO SIMPLE F C= 100 KG/CM2, INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE QUE RECIBE CONCRETO.	m <sup>2</sup>	33.28	0.78	34.06	\$ 36.32		\$ 36.32	\$ 1,208.73	\$ 28.33	\$ 1,237.06
21	PLANCHAS DE CONCRETO ARMADO DE F C 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS PARA ESTUFEA Y TARIAS.	m <sup>2</sup>	3.78	3.68	7.46	\$ 463.44		\$ 463.44	\$ 1,751.80	\$ 1,705.46	\$ 3,457.26
22	ESTRUCTURA COLUMNA DE CONCRETO DE F C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y 4 VARILLAS DEL NO. 3, 3/8" ESTRIBOS DE NO. 2 @ 15-20 CMS, DE SECCION 30X30 ACABADO APARENTE INCLUYE CHALANES.	m <sup>3</sup>	20.00		20.00	\$ 467.94		\$ 467.94	\$ 9,358.80		\$ 9,358.80

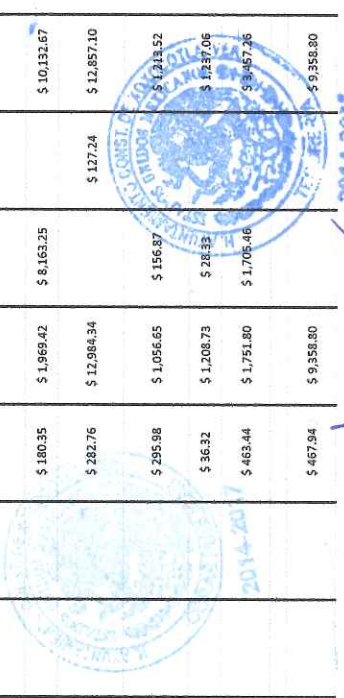

2014-2017

FINIQUITO

HOJA 1 DE 3



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA, VERACRUZ  
2014 - 2017

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS  
Y SUSTENTABILIDAD



2015-30-195-0003  
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS  
MIGUEL JAVIER DIAZ MORAEN  
Tipo: NORMAL  
2 y FINIQUITO al 19-Jun-15 al 22-Jul-15  
Período Estimación: 09-may-15  
Importe del Contrato: \$ 304,713.62  
Anticipo (c/iva) \$ 91,413.79

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRAS			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADICION.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ACTUALIZ.	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
23	TRABE T1 DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 4 VARILLAS DE 3/8" @ 10-15-20 CM SECCION 0.20 X 0.40 MTS.ACABADO APARENTE. INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y CHAFLANES.	m <sup>3</sup>	16.60		16.60	\$ 406.69			\$ 6,751.05			\$ 6,751.05
24	TRABES T2 DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2. ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y TRABES DEL 2 @ 20 CMS SECCION 0.20X0.40 MTS ACABADO APARENTE INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y CHAFLANES.	m <sup>3</sup>	19.20	13.60	5.60	\$ 477.32			\$ 9,164.54		\$ 6,491.55	\$ 2,672.99
25	LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUIE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE. INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y DE GAS	m <sup>2</sup>	74.69		74.69	\$ 670.50			\$ 50,079.65			\$ 50,079.65
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIMACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAST, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE. INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pza	1.00		1.00	\$ 3,074.40			\$ 3,074.40			\$ 3,074.40
27	CONSTRUCCION DE BASE DE TIMACO, DE 1.00X 1.00 M. LOSA DE 6 CMS DE CONCRETO ARMADO 2 MOCHETAS DE TABIQUE ROJO ASENTADO DE 11 A 14 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMA-ARENA. PROP 1:6. DE 50 CMS ALTURA, MUROS APLANADOS FINO MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5.	pza	1.00		1.00	\$ 736.69			\$ 736.69			\$ 736.69
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 X 40 CMS CON CONTRACANASTA, CESPOL, LLAVE MEZCLAORA, COFLEX, LLAVE ANGULAR, MANO DE OBRA, PRUEBAS.	pza	2.00		2.00	\$ 981.71			\$ 1,963.42			\$ 1,963.42
29	SALIDA HIDROSANTARIA A BASE DE TUBERIA DE POLIPROPILENO DE 1/2" A 3/4" Y PVC SANITARIO DE 2" 1/4" INCLUIE MANUERA Y TENDIDO DE TUBERIAS.	sal	3.00		3.00	\$ 1,367.71			\$ 4,103.13			\$ 4,103.13
30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA GAS DE ESTUFETA INCLUIE: CONECTORES, CODOS MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	1.00		1.00	\$ 485.08			\$ 485.08			\$ 485.08
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFETA DE 4 HORNILLAS INCLUIE MANGUERAS Y CONECTORES. PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	pza	1.00		1.00	\$ 755.05			\$ 755.05			\$ 755.05
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GAS DE 20 KG INCLUIE: CARGA COMPLETA DE GAS, REGULADOR, CONEXIONES Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA	pza	1.00		1.00	\$ 1,274.36			\$ 1,274.36			\$ 1,274.36
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO POLARIZADO INCLUIE APAGADORES MARCA QUINZINO O SIMILAR CON CABLE THW 12 DE 600 VOLTIOS. INCLUIE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	sal	9.00	1.00	10.00	\$ 535.66			\$ 4,820.94		\$ 535.66	\$ 5,356.60
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON BASE DE PLASTICO TIPO PORCELANA Y FOCO AHORRADOR DE 25/100 WATTS	sal	6.00		6.00	\$ 154.26			\$ 925.56			\$ 925.56
35	CENTRO DE CARGA INCLUIE: PASTILLAS DE 30 AMPERES. SUMINISTRO Y COLOCACION HERRERIA	pza	1.00		1.00	\$ 366.09			\$ 366.09			\$ 366.09
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE TABLERO DE 2.50 M X 1.00 M. INCLUIE PASADOR DE SEGURIDAD.	pza	1.00		1.00	\$ 2,474.86			\$ 2,474.86			\$ 2,474.86
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HIERRO TUBULAR GALVANIZADO DE 2.70 M X 1.50 M DE ALTURA DOS SECCIONES FIJAS Y DOS CORREZZAS INCLUIE: PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS. ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100.	pza	3.00		3.00	\$ 3,894.30			\$ 11,682.90			\$ 11,682.90
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HIERRO TUBULAR GALVANIZADO DE 2.15 M X 1.50 M DE ALTURA DOS SECCIONES FIJAS Y DOS CORREZZAS INCLUIE: PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS. ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100.	pza	1.00		1.00	\$ 2,882.30			\$ 2,882.30			\$ 2,882.30
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL NATURAL DE 5 MM. ACABADOS	m <sup>2</sup>	21.45	3.95	17.50	\$ 169.82			\$ 3,642.64		\$ 670.79	\$ 2,971.85
40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX A DOS MANOS INCLUIE :1 SELLADOR VINILICO SX1 Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	m <sup>2</sup>	202.60	31.06	171.54	\$ 51.10			\$ 10,392.86		\$ 1,587.17	\$ 8,805.69
41	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR, CON SELLO, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m <sup>2</sup>	74.69	0.54	74.15	\$ 80.25			\$ 5,993.87		\$ 49.34	\$ 5,950.53
42	MOBILIARIO SUMINISTRO DE MESA INFANTIL CUBIERTA EN MDF RECUBIERTO DE UNA MEMBRANA DE PVC TERMOFUSIONADO 80 CMS X 60 CMS X 50 CMS FABRICADA EN TUBULAR REDONDO CED. 30 CON UN MARCO PERIMETRAL DE ANGULO DE 1 X 1/8" SOLDADURA TIPO MIG MICROALAMBRE PINTURA ESMALTE ACRILICO ANTICORROSIVO REGATONES DE PVC DE ALTO IMPACTO.	pza	20.00		20.00	\$ 714.33			\$ 14,286.60			\$ 14,286.60
43	ASIENTO 30 X 30 CMS RESPALDO DE 30 X 15 CMS ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INACABO CE 1/2" ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO EN MDF 12 MM Y TRIPLE Y DE 12 MM RECLUIERTOS DE UNA MEMBRANA DE PVC TERMOFUSIONADO IMITACION MADERA.	pza	40.00		40.00	\$ 334.93			\$ 13,397.20			\$ 13,397.20



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Contrato No: 2015-30-195-0083  
Número de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS  
Contratista: MIGUEL JAVIER DIAZ MORAN  
Ejecución No: 2 Y FINIQUITO  
Período Estimado: 15-Jun-15 al 28-ago-15  
Período de Contrato: 05-may-15 al 22-Jul-15  
Importe de Contrato: \$ 304,712.62  
Convênio: Amicipo (c/iva) \$ 91,413.79

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADICIONAL	VOL. DEBECT.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE ADICIONALES	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
44	SUMINISTRO DE MAJUELE MULTUSOS PARA DESPENSA Y TRASTOS DE 1.74 M X 60 CMS X 33.5 CMS, MATERIALES MDF 24 MM RECUBIERTOS DE UNA MEMBRANA DE PVC TERMOFORMADO, ENTREPAÑOS DE 24 MM, CON MEMBRANA CAPACIDAD DE CARGA DE 60KG SIN RODAMIENTOS, FONDO TRASERO FABRICADO EN MDF DE 12 MM	pza	2.00			\$ 1,194.53		\$ 1,194.53	\$ 2,389.06		\$ 2,389.06	
45	COMPLEMENTARIOS ENTREPAÑOS DE MADERA DE BASTIDOR DE TRIPLEV EN MODULO DE FREGADEROS MEDIDAS 97 X 55 CMS	pza	2.00			\$ 359.11		\$ 359.11	\$ 718.22		\$ 718.22	
46	POZO DE ABSORCION PARA AGUAS JABONOSAS, EN TERRENO NATURAL DE 1.20 M DIAMETRO Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON GRAVA DE 3/4" A 1/2" CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE 100 KG/CM2	pza	1.00			\$ 3,332.04		\$ 3,332.04	\$ 3,332.04		\$ 3,332.04	
47	CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS DE LAS AGUAS JABONOSAS DE TABIQUE ROID RECOCIDO DE 11.14 CMS DE 0.30 X 0.50 CMS INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 76 X 56 CMS DE 6 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'c= 150 KG/CM2	pza	1.00			\$ 840.96		\$ 840.96	\$ 840.96		\$ 840.96	
48	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA FINAL	m²	74.69		0.54	\$ 5.46		\$ 5.46	\$ 407.81	\$ 2.95	\$ 404.86	
<b>SUMA TOTALES=</b>								\$ 14,900.20	\$ 14,900.20	\$ 262,683.29	\$ 262,683.27	\$ 262,683.27
<b>TOTAL</b>								\$ 304,712.59	\$ 304,712.59	\$ 304,712.59	\$ 304,712.59	\$ 304,712.59

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 119,028.90	\$ 136,073.52
2 Y FINIQUITO	\$ 143,654.39	\$ 166,639.09
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 262,683.29</b>	<b>\$ 304,712.61</b>
<b>CONTRATO:</b>		
CONVENIO	\$ 262,683.29	\$ 304,712.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 262,683.29</b>	<b>\$ 304,712.62</b>
<b>IMPORTE FINIQUITO</b>		
SALDO	\$ 262,683.29	\$ 304,712.62

MIGUEL JAVIER DIAZ MORAN  
CONTRATISTA  
EJECUTOR

ING. GABRIEL GERARDO SOLIS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
VENIFICO

ARQ. RAUL CRUZ BILLO  
DIRECTOR GENERAL DE O.P.  
V.S. B.O.

C. MARGARITA GARCIA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

